



AGRIGARDEN AMBIENTE

Gruppo Dimensione Ambiente

**Discarica per rifiuti non pericolosi ad interrimento controllato sita in
località Vespia**

Comune di Castellamonte (TO)



A.I.A. D.D n. 3893 del 04.08.2021 e s.m.i

RELAZIONE SEMESTRALE

GENNAIO-GIUGNO 2026

INDICE

- 1 PREMESSA
- 2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
- 3 QUANTITA' E TIPOLOGIA DI RIFIUTI SMALTITI
- 4 QUANTITATIVI DI RIFIUTI PRODOTTI E SMALTITI
- 5 QUANTITATIVO DI PERCOLATO PRODOTTO/SMALTITO MENSILMENTE E ANDAMENTO LIVELLI
- 6 LIVELLI DI SOGGIACENZA DEL PERCOLATO PRESSO I POZZI DI ESTRAZIONE FORZATA DEL GAS DI DISCARICA
- 7 MONITORAGGIO SEMESTRALE FINALIZZATI ALLO STUDIO QUALITATIVO DELLE ACQUE SOTTERRANEE
- 8 LIVELLI DI SOGGIACENZA DEI PIEZOMETRI COSTITUENTI LA RETE DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE
- 9 BIOGAS
- 10 VOLUMETRIA UTILE RESIDUA
- 11 MONITORAGGIO TOPOGRAFICO E GEOTECNICO
- 12 CENTRALINA METEOROLOGICA
- 13 BILANCIO IDROLOGICO

1. PREMESSA

La presente relazione ha il compito di trasmettere quanto previsto dalla D.D di AIA n. 3893 del 04.08.2021 e s.m.i in ottemperanza alle prescrizioni relativamente al periodo Gennaio-Giugno 2026.

Il Gestore della discarica esegue l'attività di raccolta dati sulle diverse matrici ambientali in funzione delle prescrizioni dell'A.I.A. e del Piano di Sorveglianza e Controllo approvato.

In merito al Piano di Sorveglianza e Controllo Marzo 2022 autorizzato dalla Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 58445 del 02.05.2022 si segnala che, a seguito dell'aggiornamento dei livelli di guardia per alcuni piezometri costituenti il sistema di monitoraggio delle acque sotterranee, il documento è stato sostituito con il Piano di Sorveglianza e Controllo Settembre 2024, approvato dalla Città Metropolitana di Torino con nota prot. 168487/2024 del 26/11/2024.

La presente relazione illustra i dati relativi al primo semestre 2026 riguardanti i quantitativi e la tipologia di rifiuti smaltiti e prodotti, le soggiacenze dei piezometri della rete delle acque sotterranee e relative analisi chimiche per determinati piezometri, i battenti di percolato nei pozzi interni indicati in A.I.A. appartenenti alla rete di estrazione del biogas, gli interventi riguardanti l'intero impianto del biogas, la qualità del gas estratto dalla linea di adduzione generale, la volumetria utile residua, i monitoraggi topografici e geotecnici e il bilancio idrologico.

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- D.D. di AIA n° 3893 del 04.08.2021 e s.m.i. Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs N.152/2016 e s.m.i
- Progetto di Risagomatura finale e recupero ambientale: allegato F INT3 Piano di Sorveglianza e Controllo Settembre 2024.

3. QUANTITA' E TIPOLOGIA DI RIFIUTI SMALTITI

L'impianto di smaltimento rifiuti ad interrimento controllato gestito dalla società Agrigarden Ambiente Srl, titolare della D.D di AIA n. 3893 del 04.08.2021 ha conferito presso l'installazione durante il primo semestre 2026

Kg 1.558.890

di cui **kg 290.140** esclusivamente per le operazioni di copertura definitiva della discarica, in particolare la realizzazione dello strato di drenaggio del biogas.

Di seguito, per ciascun EER e periodo, si riportano i quantitativi di rifiuti smaltiti nel semestre di interesse.

Scheda riepilogativa relativa ai quantitativi di rifiuti smaltiti in discarica

Gennaio-Giugno 2026

EER 19.12.12 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11			
EER autorizzato	Quantitativo smaltito	Unità di misura	Mese riferimento
19.12.12	381.280	Kg	Gennaio
19.12.12	203.380	Kg	Febbraio
19.12.12	365.300	Kg	Marzo
19.12.12	116.090	Kg	Aprile
19.12.12	28.760	Kg	Maggio
19.12.12	115.360	Kg	Giugno

EER 19.12.04 Plastica e gomma			
EER autorizzato	Quantitativo smaltito	Unità di misura	Mese riferimento
19.12.04	- - -	Kg	Gennaio
19.12.04	58.580	Kg	Febbraio
19.12.04	- - -	Kg	Marzo
19.12.04	- - -	Kg	Aprile
19.12.04	- - -	Kg	Maggio
19.12.04	- - -	Kg	Giugno

Sono stati gestiti come materiali per la realizzazione della copertura definitiva (strato di drenaggio del biogas) i seguenti EER e relativi quantitativi:

EER 19.12.04 <i>Plastica e gomma</i>			
EER autorizzato	Quantitativo smaltito	Unità di misura	Mese riferimento
19.12.04	- - -	Kg	Gennaio
19.12.04	- - -	Kg	Febbraio
19.12.04	- - -	Kg	Marzo
19.12.04	- - -	Kg	Aprile
19.12.04	290.140	Kg	Maggio
19.12.04	- - -	Kg	Giugno

4. QUANTITATIVI DI RIFIUTI PRODOTTI E SMALTITI

Nel periodo interessato, oltre allo smaltimento del percolato da discarica, non si è originato altro rifiuto per il quale è stato necessario lo smaltimento presso impianti terzi autorizzati.

5. QUANTITATIVI DI PERCOLATO PRODOTTI E SMALTITI MENSILMENTE

I quantitativi di percolato totali smaltiti relativi al primo semestre 2026 sono pari a **6.145.880 Kg**, di cui **6.115.600 Kg** smaltiti in rete fognaria a seguito dell'ottenimento della Determina Dirigenziale n. 2024 del 17/04/2023 e secondo quanto specificato dalla stessa.

I restanti **30.280 Kg** sono stati smaltiti tramite autobotti presso impianti autorizzati.

Il tutto è riassumibile nella seguente tabella:

Mese di riferimento	Percolato smaltito con autobotti (Kg)	Percolato smaltito in rete fognaria (mc)
Gennaio	- - -	1.245,80
Febbraio	- - -	1.111,50
Marzo	30.280	991,50
Aprile	- - -	1.036,30
Maggio	- - -	984,30
Giugno	- - -	746,20

Per quanto riguarda il percolato smaltito tramite autobotti si elencano, nella tabella sottostante, gli impianti di destino e le relative operazioni di smaltimento del percolato prodotto nel secondo semestre:

Impianto di trattamento acque	Codice smaltimento	Quantità smaltita (Kg)
Cordar Spa Biella Servizi - impianto di Cossato (BI)	D8	30.280

Ad oggi l'impianto di estrazione del percolato è dotato di un sistema di rilevazione automatica del battente di percolato presso rispettivamente i pozzi accessori nr. 2 (settore Ovest), nr. 3 (settore Sud) e nr. 6 (settore terra armata lato Ovest)

Si riporta in **allegato 1** le tabelle relative ai pozzi accessori nr. 2, 3 e 6 indicante l'andamento del livello del percolato misurato. Le anomalie di registrazione sono indicate con la dicitura n.d, che significa che il dato non è disponibile per una mancata registrazione del sistema.

6. LIVELLI DI SOGGIACENZA DEL PERCOLATO PRESSO I POZZI DI ESTRAZIONE FORZATA DEL GAS DI DISCARICA

Il Gestore ha provveduto durante il primo semestre 2026 alla misurazione dei livelli di percolato presso i pozzi del biogas per i quali è prevista la misurazione ed in particolare:

Pozzo P1 bis, P36, P38, P23, P15, P3, P31, P12, P13 e P44.

In allegato 2 si trasmettono le misurazioni eseguite con cadenza mensile.

Con la presente si intende comunque ribadire che i pozzi oggetto di misurazioni, sono manufatti adibiti all'estrazione del biogas e pertanto al loro interno possono presentare delle occlusioni da materiale fangoso e possono essere costituiti da una non perfetta verticalità dell'asse del pozzo.

Pertanto le misurazioni allegate, ottenute dalla differenza tra la profondità presunta del pozzo e la profondità misurata del percolato dalla testa di pozzo mediante l'uso dello strumento, devono essere considerate indicative e con un possibile margine di incertezza.

7. MONITORAGGIO SEMESTRALE FINALIZZATO ALLO STUDIO QUALITATIVO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Le analisi delle acque sotterranee relative ai piezometri Pa7, Pa9, Pa15 e Pa16 sono effettuate con cadenza semestrale.

I monitoraggi di tali piezometri sono finalizzati allo studio qualitativo delle acque sotterranee, attraverso la rilevazione in sito dei seguenti parametri chimico-fisici:

soggiacenza della falda (in m s.l.m.)	temperatura atmosferica (°C)
temperatura delle acque di falda (°C)	presenza di eventuali fasi libere separate
potenziale RedOx (Eh, mV)	

Nei rapporti di prova in allegato relativi alle indagini sulla qualità delle acque sotterranee vengono riportati inoltre i seguenti dati:

data e ora di campionamento	portata di campionamento
nome o sigla dell'operatore	profondità di campionamento
condizioni meteorologiche generali al momento del campionamento	aspetto del campione (colore, odore, torbidità)
durata e portata dello spurgo preliminare del pozzo	metodo dettagliato di conservazione del campione

In **Allegato 3** si trasmettono i verbali di campionamento e i rapporti analitici a cura del laboratorio **Medilabor SC** relativi alla campagna di monitoraggio di Aprile 2026.

8. LIVELLI DI SOGGIACENZA DEI PIEZOMETRI COSTITUENTI LA RETE DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Il Gestore rileva mensilmente i dati di soggiacenza della falda di tutta la rete piezometrica denominata Pa a servizio dell'installazione.

Si riportano in **Allegato 4** i relativi rilievi mensili da Gennaio a Giugno 2026, condotti da operatori interni Agrigarden Ambiente o da laboratori incaricati esterni.

9. BIOGAS

L'impianto di estrazione e combustione del biogas è costituito da un numero complessivo di 60 pozzi di estrazione del biogas e da nr. 5 sottostazioni di regolazioni del biogas ubicate lungo il perimetro della vasca. Temporaneamente è presente una sottostazione aggiuntiva attiva presso il settore Nord Est, che verrà sostituita con la nuova sottostazione presente presso il settore Est perimetrale dell'impianto, una volta che si procederà all'abbancamento dei rifiuti presso il nuovo settore Est dell'invaso, in modo tale da permettere la corretta installazione delle linee secondarie di trasporto del biogas dai pozzi alla stazione di regolazione.

I pozzi attualmente in esercizio sono elencati qui di seguito:

Pozzo vecchia denominazione	Pozzo nuova denominazione
121	P14
128	P16
146	P10
151	P15
152	P11
204	P18
205	P19
206	P20
208	P12
209	P8
210	P1
211	P5
213	P13
214	P30
215	P2
216	P4
217	P3
219	P7
220	P6
221	P9
	P1 bis
	P36
	P37
	P38
	P24
	P25
	P26
	P27
	P28
	P29
	P23
	P33
	P21
	P22
	P34
	P31
	P32
	P17
	P35
	P43

Relazione semestrale Gennaio-Giugno 2026 Agrigarden Ambiente S.r.l.

	P42
	P39
	P40
	P41
	P44
	P45
	P46
	P48
	P47
	P49
	P50
	B1
	B2
	B3
	B4
	B5
	B6
	B7
	B8
	B9

Elenco dei pozzi in funzione durante il primo semestre 2026

Dati quantitativi

Qui di seguito si riportano i dati mensili del primo semestre 2026 relativamente alla quantità di biogas inviato in torcia, alla qualità del gas estratto, alla temperatura di combustione della torcia e alle ore di suo funzionamento.

Tali dati sono rilevati dal quadro di comando della centrale di estrazione e combustione generale.

Mese	Quantità biogas inviata in torcia (mc)	Concentrazione metano (CH4)	Concentrazione ossigeno (O2)	Ore funzionamento torcia	Temperatura media torcia (°C)
Gennaio	219.416	21.4 %	3.2 %	740	896°
Febbraio	190.807	20.1 %	3.3 %	720	873°
Marzo	235.365	20.9 %	3.0 %	730	902°
Aprile	218.838	22.0 %	3.0 %	735	886°
Maggio	258.981	22.2 %	2.9 %	740	901°
Giugno	199.826	24.7 %	2.5 %	720	915°

Dati qualitativi del biogas estratto dalla linea di adduzione generale

In data 28/04/2026 i tecnici del laboratorio specializzato Medilabor SC hanno provveduto ad eseguire il campionamento e l'analisi del biogas prodotto dalla discarica, presso la linea di adduzione principale collocata prima dell'ingresso alla torcia di combustione.

In **Allegato 5** si trasmette il Rapporto Tecnico n. R83-2026 elaborato dal laboratorio specializzato Medilabor SC

10. VOLUMETRIA UTILE RESIDUA

In data 01 Giugno 2026 si è proceduto ad eseguire il rilievo plano altimetrico della discarica al fine di verificare le volumetrie utili residue per lo smaltimento dei rifiuti.

Le volumetrie residue calcolate al 01 Giugno 2026 sono pari a circa 6.440 mc.

Il Gestore stima un tempo di esaurimento delle volumetrie residue pari a circa 6 mesi.

In **Allegato 6** si riporta il rilievo plano altimetrico eseguito in data 01/06/2026 corredato da specifiche sezioni, elaborato dallo studio Bertolino Costruzioni Srl.

Durante il semestre in oggetto i conferimenti dei rifiuti si sono concentrati principalmente presso il settore sommitale della discarica.

Come comunicato con ns nota prot. 15-26-C del 13/05/2026, durante il mese di Maggio sono iniziate le attività di copertura definitiva presso il settore Nord dell'impianto, in particolare presso il settore spondale a valle della pista di accesso, come raffigurato nel rilievo topografico in Allegato 6.

Qui di seguito si riportano alcune fotografie raffiguranti la realizzazione degli strati della copertura definitiva secondo il progetto autorizzato.

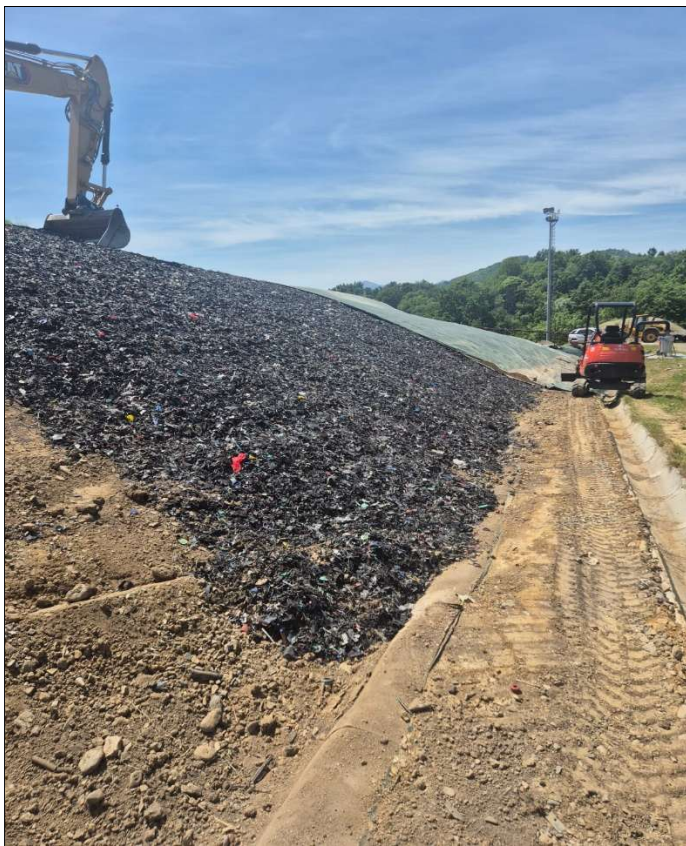


Figura 1: realizzazione strato di drenaggio del biogas



Figura 2: Posa dei materiali geosintetici



Figura 3: realizzazione gabbionatura al piede della sponda



Figura 4: Posa strato terreno finale

Le attività sopracitate proseguiranno durante il secondo semestre 2026 al fine di completare la copertura definitiva presso il settore nord come da ns nota prot. 15-26-C del 13/05/2026. Terminato tale settore, le attività di copertura definitiva proseguiranno presso il settore spondale Ovest Lato Malesina (sotto la pista di accesso), il cui inizio sarà opportunamente comunicato.

11. MONITORAGGIO TOPOGRAFICO E GEOTECNICO

Il monitoraggio topografico della discarica, viene eseguito attraverso la misura ed elaborazione di dati ottenuti dal rilevamento mediante mire topografiche installate nei settori spondali Nord ed Ovest dell'impianto.

Il gestore ha affidato, ad un professionista specializzato topografo Ing. Bertolino, un incarico con cadenza mensile, per eseguire le seguenti attività:

- monitoraggio topografico presso le singole mire
- elaborazione dei dati e restituzione dei risultati mediante specifiche tabelle e grafici

Nel mese di Giugno 2026 non sono state eseguite le misure topografiche presso le mire denominate P13, P14, P16 e P17 in quanto tali mire sono state temporaneamente rimosse per permettere le operazioni di copertura definitiva presso il settore Nord della discarica.

In **Allegato 7** si riportano i relativi risultati.

In generale le misure rilevate evidenziano valori di abbassamento dovuti al normale cedimento del corpo rifiuti.

Per quanto riguarda invece il monitoraggio geotecnico ed in particolare alle misure inclinometriche, l'impianto è costituito da nr. 3 inclinometri, posizionati rispettivamente presso la terra armata lato Sud-Ovest (denominato IN1), terra armata sponda Ovest Lato Malesina (denominato IN2), terra armata lato Nord (denominato IN3). Si precisa che le misure inclinometriche eseguite presso gli inclinometri IN2 e IN3 sono iniziate a partire dal mese di Luglio 2022 a seguito del collaudo eseguito per le nuove opere di allestimento del Progetto di risagomatura finale della discarica. Le misure e le elaborazioni dei dati sono contenute all'interno della relazione geotecnica a firma del Geol. Corrado Duregon in **Allegato 8**.

Le misure eseguite durante il semestre in oggetto hanno confermato l'assenza di anomalie particolari presso i tre inclinometri. Come riportato nella relazione di monitoraggio geotecnico, le misure successive saranno utili per verificare l'evoluzione del fenomeno.

12. CENTRALINA

L'impianto è dotato di una centralina meteorologica idonea alla rilevazione dell'intensità e della direzione del vento, della temperatura dell'aria, dell'umidità dell'aria e delle precipitazioni meteoriche. La stazione meteorologica presente è una centralina professionale Davis Instruments AN ISO 9001 adeguata all'utilizzo in impianti di smaltimento secondo D.L. 36/2002.

In **Allegato 9** si riportano le tabelle relative alle condizioni meteorologiche del primo semestre 2026.

13. BILANCIO IDROLOGICO

Relativamente al primo semestre 2026 e al fine di valutare il bilancio idrico del sito, si è ricorso all'utilizzo di un metodo numerico empirico per la valutazione dell'infiltrazione efficace. Il dato relativo all'infiltrazione efficace corrisponde alla quantità d'acqua meteorica caduta sulla superficie della discarica che si infila all'interno del corpo rifiuti. Data la geometria del sito, discarica in rilevato, si sono considerate tre tipologie di aree:

- l'area complessiva del sito in cui vi è stato apporto di rifiuti per il relativo periodo di conferimento, con relativa movimentazione delle superfici di copertura.
- l'area con copertura provvisoria realizzata con terreno
- l'area di copertura provvisoria realizzata con teli impermeabili

A tal proposito si sono ricavate le superfici di riferimento, (vedi **Allegato 10**), considerandole ai fini del calcolo riportati nella tabella sottostante.

I valori di infiltrazione efficace adottati nel calcolo sono stati tre diversi, per le tre diverse zone considerate, sulla base anche delle relazioni empiriche suggerite da APAT per "*Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio assoluta nei siti contaminati*".

Per le aree utilizzate nel semestre per la coltivazione, è stato cautelativamente considerato un parametro di $I_{ef} = 0.018 P^2$, valore di un ordine di grandezza superiore rispetto a terreni omogenei di natura sabbiosa, considerata la mancata presenza di copertura erbosa superficiale.

Per le aree dotate di copertura superficiale con terreno è stato utilizzato il parametro $I_{ef} = 0.0126 P^2$, valore ridotto di un fattore pari a 0.7, adottando una copertura superficiale effettuata mediante terreno (>0.3m), sempre con il medesimo fattore di sicurezza applicato al punto precedente.

Per le aree dotate di copertura superficiale con teli è stato utilizzato il parametro $I_{ef} = 0.0018 P^2$, valore adottato per una copertura superficiale effettuata mediante terreno (>0.3m).

Si è considerata in prima approssimazione come trascurabile il tempo di attraversamento del corpo rifiuti, considerandolo come un mezzo poroso saturo.

In base ai risultati ottenuti e riportati nella tabella seguente del bilancio idrologico, si può osservare che nel primo semestre sono caduti circa 47,8 cm di pioggia.

Osservando i dati meteorologici in **allegato 9**, si osserva che il semestre in oggetto è stato caratterizzato da precipitazioni meteoriche leggermente inferiori alla media, in particolare per quanto riguarda i mesi di Aprile e Maggio, che normalmente sono caratterizzati da precipitazioni abbondanti e durature.

In base ai calcoli elaborati si evince un complessivo infiltrato teorico all'interno del corpo dei rifiuti pari a circa 985 mc ed una quantità di percolato realmente smaltita da Gennaio a Giugno pari a 6.156 mc.

I dati dimostrano che il percolato che si è potuto teoricamente produrre in base ai calcoli sul quantitativo infiltrato, è stato regolarmente estratto ed inviato a smaltimento da parte del Gestore.

	PRIMO SEMESTRE 2026						Complessivo
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	
Pioggiosità mensile (cm)	7,46	7,49	12,12	9,58	6,34	4,88	47,87
Superfici in coltivazione	5.682	5.682	5.682	5.682	5.682	5.682	
Superfici telate	29.171	29.171	29.171	29.171	29.171	29.171	
Superfici con copertura provvisoria (terreno)	6.584	6.584	6.584	6.584	6.584	6.584	
Leff coltivazione	0,018						
Leff chiusura con terreno	0,0126						
Leff chiusura con teli	0,0018						
Infiltrazione unitaria coltivazione (cm)	1,002	1,010	2,644	1,652	0,724	0,429	
Infiltrazione unitaria chiusura terreno (cm)	0,701	0,707	1,851	1,156	0,50646	0,300	
Infiltrazione unitaria chiusura teli (cm)	0,100	0,101	0,264	0,165	0,07235	0,043	
Infiltrazione totale coltivazione (m3)	57	57	150	94	41	24	
Infiltrazione totale chiusura terreno (m3)	46	47	122	76	33	20	
Infiltrazione totale chiusura teli (m3)	29	29	77	48	21	13	
Quantitativo complessivo infiltrato (m3)	132	133	349	218	96	57	985
Percolato smaltito (m3)	1.245,80	1.112,00	1.021,28	1.021,00	984,00	772,00	6.156,08

Bilancio idrologico primo semestre 2026

Agrigarden Ambiente S.r.l.

Il Responsabile Tecnico

